



eso

**AB „Energijos skirstymo operatorius“
vykdomi pirkimai ekonominio
naudingumo principu**



eso

Ekonominio naudingumo pirkimai

1

Ekonominio naudingumo pirkimo principai

Object OHL to SAX			Min offered values			Contractor offer		
Parameters	Sum (S)	Place in procurement	Min accomplishment term	Min outage time	MIN Price	accomplishment term	outage time	Price
Counting formula $S=C+T1+T2$			days	hours	EUR	days	hours	EUR
Contractor 1	0,91	2	70	140	173000	70	200	173000
Contractor 2	0,846	4				70	180	200000
Contractor 3	0,875	3				70	160	200000
Contractor 4	0,912	1				70	140	200000



Ekonominio naudingumo pirkimai

2

Ekonominio naudingumo pirkimo principai




Pasiūlymo
kaina

60 %



Objekto
įgyvendinimo
terminas

5 %



Planinio
elektros
energijos
vartotojų
atjungimo
laikas

35 %

Ekonominio naudingumo pirkimai

Pilotinio projekto informacija



1 Objektai

2016 metais įvykdyti 27 rangos darbų (virš 30 tūkst. eur.) pirkimai



2 Biudžetas

Bendras objektų suplanuotas biudžetas – 3 239 000 Eur.



3 Darbai

Numatyti vykdyti darbai – 0,4-10 kV kapitalinis remontas



4 Objekto įvykdymo terminas

Objektų įvykdymui buvo skiriama 1840 k.d. arba 68 k.d. vienam objektui

Ekonominio naudingumo pirkimai

Rezultatai



REZULTATAI

Rangovinių organizacijų skaičius

Rangos darbų sutartis pasirašiusių rangovinių organizacijų **skaičius**

10

Finansinė nauda

Vykdam darbus greičiau Rangovinės organizacijos **uždirbo**

23 %

Planiniai atjungimai

Bendra planinių atjungimų trukmė **sumažėjo**

30 %

Objekto vykdymo trukmė

Bendra planinių atjungimų trukmė **sumažėjo**

17 %

Faktinis sutarčių įvykdymas

Tinkamai įvykdytų sutarčių skaičius

21 vnt.


Netinkamai įvykdytų sutarčių skaičius

6 vnt.

ESO elektros daliai vykdomi pirkimai

	Pirkimai, vnt.	Ekonominio naudingumo principu	Santykis,%
Inicijuota (iki 05.01)	760	188	25
Planuojama (nuo 05.01 iki 12.31)	735	680	93
Viso	1495	868	58

PIRKIMAI

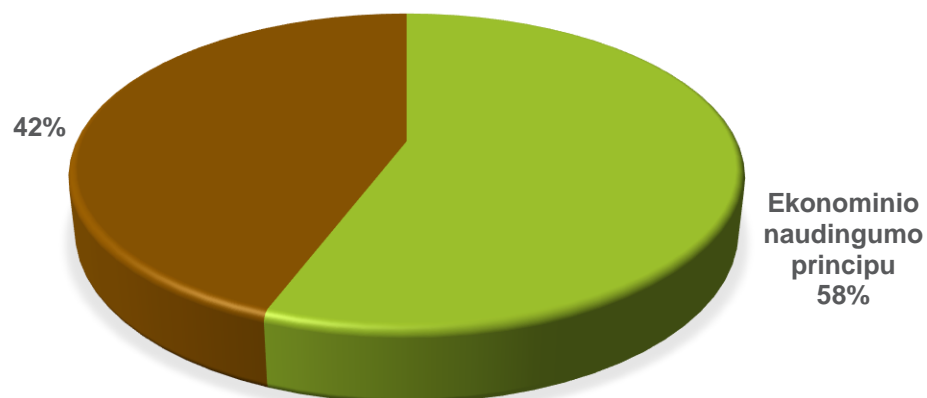

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Pasiūlymo kaina (C)	Vertinama galutinio pasiūlymo kaina (projektiniam kiekiui) EUR be PVM	X
Projektavimo darbų atlikimo laikas (T_P)	Vertinamas nenutrūkstamas projektavimo darbų atlikimo laikas kalendorinėmis dienomis	Y
Rangos darbų atlikimo laikas (T_D)	Vertinamas nenutrūkstamas rangos darbų atlikimo laikas kalendorinėmis dienomis.	Z
Linijos atjungimo trukmė (T_L)	Vertinama linijos atjungimo trukmė valandomis	Q

Tiekėjo techninis pasiūlymas, surinkęs mažiau kaip 25 balus, atmetamas.

Privalomi kriterijai

Pasiūlymo kaina C
Rangos darbų atlikimo laikas T_D

Metodika Nr. 1

Pasiūlymo kaina C
+
Rangos darbų atlikimo laikas T_D

Metodika Nr. 2

Pasiūlymo kaina C
+
Rangos darbų atlikimo laikas T_D
+
Linijos atjungimo trukmė T_L

Metodika Nr. 3

Pasiūlymo kaina C
+
Projektavimo darbų atlikimo laikas T_D
+
Rangos darbų atlikimo laikas T_P

DARBŲ PRIĖMIMAS IR SUTARTIES VYKDYMAS

Rangos darbų atlikimo laikas (T_D)

1 Lyginamas Pasiūlyme pateiktas darbų atlikimo terminas su faktine darbų pabaiga (ADA data).

Projektavimo darbų atlikimo laikas (T_P)

2 Lyginamas Pasiūlyme pateiktas projektavimo darbų atlikimo terminas su faktine projekto patvirtinimo data (ADA data).

Linijos atjungimo trukmė (T_L)

3 Lyginama Pasiūlyme pateikta linijos atjungimo trukmė su faktine linijos atjungimo trukme.

Vykdamant Sutartį vertinimo kriterijai nekeičiami.



eso

Nes mums rūpi
